



CONSORCIO CABO ROJO DEVELOPMENT

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1	1	CRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN DE HOTEL LOTE No. DIEZ (10) DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES	356 days	Mon 02 Jan '23	Tue 20 Feb '24
2	1.1	INICIO PROYECTO	0 days	Mon 02 Jan '23	Mon 02 Jan '23
3	1.2	PRELIMINARES Y GENERALES	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
4	1.2.1	Verja Perimetral	20 days	Mon 02 Jan '23	Tue 24 Jan '23
6	1.2.2	Almacén	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
9	1.2.3	Oficina	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
12	1.2.4	Baños Portátiles	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
15	1.2.5	Comedor de Empleados	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
17	1.2.6	Seguridad en Obra	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
19	1.2.7	Suministro e Instalación de Energía en Obra	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
24	1.2.8	Suministro de Servicio de Agua a Obra	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
27	1.2.9	Letrero de Obra	3 days	Mon 02 Jan '23	Wed 04 Jan '23
29	1.2.10	Brigada Topográfica	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
31	1.2.11	Logística y Traslado de Materiales (Horizontal y Vertical)	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
34	1.3	A- LOBBY Y SALÓN DE CONVENCIONES	215 days	Sat 11 Mar '23	Fri 17 Nov '23
35	1.3.1	Hito Inicio	0 days	Sat 11 Mar '23	Sat 11 Mar '23
36	1.3.2	Movimiento de Tierras	9 days	Mon 13 Mar '23	Wed 22 Mar '23
43	1.3.3	Hormigón Armado	186 days	Tue 21 Mar '23	Mon 23 Oct '23
64	1.3.4	Terminaciones Arquitectónicas	175 days	Fri 28 Apr '23	Fri 17 Nov '23
149	1.3.5	Elevadores	30 days	Fri 18 Aug '23	Thu 21 Sep '23
151	1.4	B- TIENDAS Y REPRESENTANTES	104 days	Wed 19 Jul '23	Fri 17 Nov '23
152	1.4.1	Hito Inicio	0 days	Wed 19 Jul '23	Wed 19 Jul '23
153	1.4.2	Movimiento de Tierras	3 days	Thu 20 Jul '23	Sat 22 Jul '23
160	1.4.3	Hormigón Armado	101 days	Sat 22 Jul '23	Thu 16 Nov '23
181	1.4.4	Terminaciones Arquitectónicas	93 days	Wed 02 Aug '23	Fri 17 Nov '23
255	1.5	C- RESTAURANTES Y HABITACIONES	355 days	Mon 02 Jan '23	Mon 19 Feb '24
256	1.5.1	Hito Inicio	0 days	Mon 02 Jan '23	Mon 02 Jan '23
257	1.5.2	Movimiento de Tierras	15 days	Mon 02 Jan '23	Wed 18 Jan '23
264	1.5.3	Hormigón Armado	285 days	Mon 16 Jan '23	Wed 13 Dec '23
315	1.5.4	Terminaciones Arquitectónicas	303 days	Fri 03 Mar '23	Mon 19 Feb '24
542	1.6	D- RESTAURANT PISCINA	76 days	Sat 11 Nov '23	Thu 08 Feb '24
543	1.6.1	Hito	0 days	Sat 11 Nov '23	Sat 11 Nov '23
544	1.6.2	Movimiento de Tierras	3 days	Mon 13 Nov '23	Wed 15 Nov '23
550	1.6.3	Hormigón Armado	46 days	Wed 15 Nov '23	Sat 06 Jan '24
563	1.6.4	Terminaciones Arquitectónicas	67 days	Thu 23 Nov '23	Thu 08 Feb '24
616	1.7	E- HABITACIONES FAMILY	356 days	Mon 02 Jan '23	Tue 20 Feb '24
617	1.7.1	Hito	0 days	Mon 02 Jan '23	Mon 02 Jan '23
618	1.7.2	Movimiento de Tierras	12 days	Mon 02 Jan '23	Sat 14 Jan '23
625	1.7.3	Hormigón Armado	280 days	Mon 09 Jan '23	Thu 30 Nov '23
709	1.7.4	Terminaciones Arquitectónicas	338 days	Mon 23 Jan '23	Tue 20 Feb '24
988	1.7.5	Elevadores	40 days	Wed 03 Jan '24	Sat 17 Feb '24
990	1.8	F-G- HABITACIONES FAMILY SELECTION	319 days	Mon 02 Jan '23	Mon 08 Jan '24
991	1.8.1	Hito	0 days	Mon 02 Jan '23	Mon 02 Jan '23
992	1.8.2	Movimiento de Tierras	10 days	Mon 02 Jan '23	Thu 12 Jan '23
999	1.8.3	Hormigón Armado	214 days	Fri 06 Jan '23	Tue 12 Sep '23
1084	1.8.4	Terminaciones Arquitectónicas	310 days	Thu 12 Jan '23	Mon 08 Jan '24
1338	1.8.5	Elevadores	45 days	Thu 05 Oct '23	Sat 25 Nov '23
1340	1.9	H- HABITACIONES SELECTION	246 days	Mon 02 Jan '23	Sat 14 Oct '23
1341	1.9.1	Hito	0 days	Mon 02 Jan '23	Mon 02 Jan '23
1342	1.9.2	Movimiento de Tierras	10 days	Mon 02 Jan '23	Thu 12 Jan '23
1349	1.9.3	Hormigón Armado	182 days	Fri 06 Jan '23	Sat 05 Aug '23
1427	1.9.4	Terminaciones Arquitectónicas	229 days	Sat 21 Jan '23	Sat 14 Oct '23
1686	1.9.5	Elevadores	40 days	Wed 02 Aug '23	Sat 16 Sep '23
1688	1.10	I- GIMNASIO Y SPA	151 days	Sat 29 Jul '23	Mon 22 Jan '24
1689	1.10.1	Hito	0 days	Sat 29 Jul '23	Sat 29 Jul '23
1690	1.10.2	Preliminares	1 day	Mon 31 Jul '23	Mon 31 Jul '23
1692	1.10.3	Movimiento de Tierras	11 days	Tue 01 Aug '23	Sat 12 Aug '23
1700	1.10.4	Estructuras y Hormigones	46 days	Mon 14 Aug '23	Thu 05 Oct '23
1717	1.10.5	Muros y Divisiones	11 days	Tue 10 Oct '23	Sat 21 Oct '23

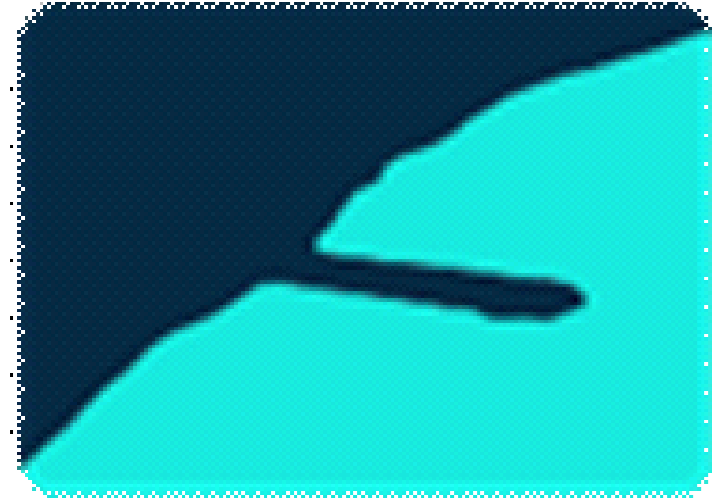

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1722	1.10.6	Albañilería	30 days	Mon 09 Oct '23	Sat 11 Nov '23
1730	1.10.7	Pinturas	21 days	Fri 29 Dec '23	Mon 22 Jan '24
1734	1.10.8	Falsos Techos	23 days	Sat 02 Dec '23	Thu 28 Dec '23
1740	1.10.9	Pisos	20 days	Thu 09 Nov '23	Fri 01 Dec '23
1752	1.10.10	Revestimientos	5 days	Tue 28 Nov '23	Sat 02 Dec '23
1755	1.10.11	Instalaciones Sanitarias	17 days	Thu 30 Nov '23	Tue 19 Dec '23
1767	1.10.12	Puertas	4 days	Thu 23 Nov '23	Mon 27 Nov '23
1772	1.10.13	Carpintería de Aluminio	5 days	Wed 20 Dec '23	Mon 25 Dec '23
1776	1.10.14	Jardinería	6 days	Wed 03 Jan '24	Tue 09 Jan '24
1780	1.10.15	Misceláneos	62 days	Mon 23 Oct '23	Tue 02 Jan '24
1786	1.11	J- ÁREA DEPORTIVA	77.5 days	Sat 20 May '23	Sat 19 Aug '23
1787	1.11.1	Hito	0 days	Sat 20 May '23	Sat 20 May '23
1788	1.11.2	Preliminares	2 days	Mon 22 May '23	Tue 23 May '23
1790	1.11.3	Movimiento de Tierras	6 days	Wed 24 May '23	Tue 30 May '23
1796	1.11.4	Estructuras y Hormigones	55 days	Wed 31 May '23	Wed 02 Aug '23
1806	1.11.5	Muros y Divisiones	17 days	Fri 21 Jul '23	Wed 09 Aug '23
1811	1.11.6	Albañilería	14 days	Sat 22 Jul '23	Mon 07 Aug '23
1818	1.11.7	Pinturas	17.5 days	Mon 31 Jul '23	Sat 19 Aug '23
1823	1.11.8	Falsos Techos	4 days	Wed 09 Aug '23	Sat 12 Aug '23
1827	1.11.9	Aparatos Sanitarios Baños	11 days	Wed 02 Aug '23	Mon 14 Aug '23
1839	1.11.10	Puertas	1 day	Fri 28 Jul '23	Fri 28 Jul '23
1841	1.11.11	Carpintería de Aluminio	1 day	Sat 29 Jul '23	Sat 29 Jul '23
1844	1.12	K- KID'S CLUB	106 days	Tue 13 Jun '23	Sat 14 Oct '23
1845	1.12.1	Hito	0 days	Tue 13 Jun '23	Tue 13 Jun '23
1846	1.12.2	Preliminares	1 day	Wed 14 Jun '23	Wed 14 Jun '23
1848	1.12.3	Movimiento de Tierras	4 days	Thu 15 Jun '23	Mon 19 Jun '23
1856	1.12.4	Estructuras y Hormigones	37 days	Tue 20 Jun '23	Tue 01 Aug '23
1870	1.12.5	Muros y Divisiones	5 days	Wed 02 Aug '23	Mon 07 Aug '23
1872	1.12.6	Albañilería	34 days	Thu 27 Jul '23	Mon 04 Sep '23
1881	1.12.7	Pinturas	21 days	Thu 21 Sep '23	Sat 14 Oct '23
1885	1.12.8	Falsos Techos	8 days	Tue 12 Sep '23	Wed 20 Sep '23
1890	1.12.9	Pisos	4 days	Tue 05 Sep '23	Fri 08 Sep '23
1897	1.12.10	Revestimientos	5 days	Wed 06 Sep '23	Mon 11 Sep '23
1902	1.12.11	Instalaciones Sanitarias	24 days	Tue 12 Sep '23	Mon 09 Oct '23
1914	1.12.12	Puertas	1 day	Tue 12 Sep '23	Tue 12 Sep '23
1917	1.12.13	Carpintería de Aluminio	3 days	Tue 12 Sep '23	Thu 14 Sep '23
1920	1.12.14	Misceláneos	47 days	Tue 08 Aug '23	Sat 30 Sep '23
1923	1.13	L- BOH	212 days	Sat 15 Apr '23	Tue 19 Dec '23
1924	1.13.1	Hito	0 days	Sat 15 Apr '23	Sat 15 Apr '23
1925	1.13.2	Preliminares	1 day	Mon 17 Apr '23	Mon 17 Apr '23
1927	1.13.3	Movimiento de Tierras	20 days	Tue 18 Apr '23	Wed 10 May '23
1937	1.13.4	Estructuras y Hormigones	75 days	Thu 11 May '23	Sat 05 Aug '23
1952	1.13.5	Muros y Divisiones	14 days	Mon 07 Aug '23	Tue 22 Aug '23
1954	1.13.6	Albañilería	42 days	Mon 07 Aug '23	Sat 23 Sep '23
1962	1.13.7	Pinturas	33 days	Tue 31 Oct '23	Thu 07 Dec '23
1966	1.13.8	Falsos Techos	13 days	Mon 16 Oct '23	Mon 30 Oct '23
1968	1.13.9	Pisos	66 days	Wed 23 Aug '23	Tue 07 Nov '23
1976	1.13.10	Revestimientos	5 days	Mon 25 Sep '23	Fri 29 Sep '23
1978	1.13.11	Instalaciones Sanitarias	9 days	Mon 27 Nov '23	Wed 06 Dec '23
1989	1.13.12	Puertas	10 days	Fri 08 Dec '23	Tue 19 Dec '23
1993	1.13.13	Carpintería de Aluminio	6 days	Fri 08 Dec '23	Thu 14 Dec '23
1995	1.13.14	Misceláneos	3 days	Wed 08 Nov '23	Fri 10 Nov '23
1997	1.14	VIALIDAD	105 days	Thu 19 Oct '23	Mon 19 Feb '24
1998	1.14.1	Hito	0 days	Thu 19 Oct '23	Thu 19 Oct '23
1999	1.14.2	Circulación de Servicio	97 days	Fri 20 Oct '23	Fri 09 Feb '24
2018	1.14.3	Circulación Semipública	84 days	Tue 14 Nov '23	Mon 19 Feb '24
2037	1.14.4	Circulación Interna	40 days	Fri 15 Dec '23	Tue 30 Jan '24
2047	1.14.5	Túnel de Servicio	43 days	Fri 22 Dec '23	Fri 09 Feb '24
2057	1.15	PISCINAS	195 days	Wed 05 Jul '23	Fri 16 Feb '24
2058	1.15.1	Hito	0 days	Wed 05 Jul '23	Wed 05 Jul '23

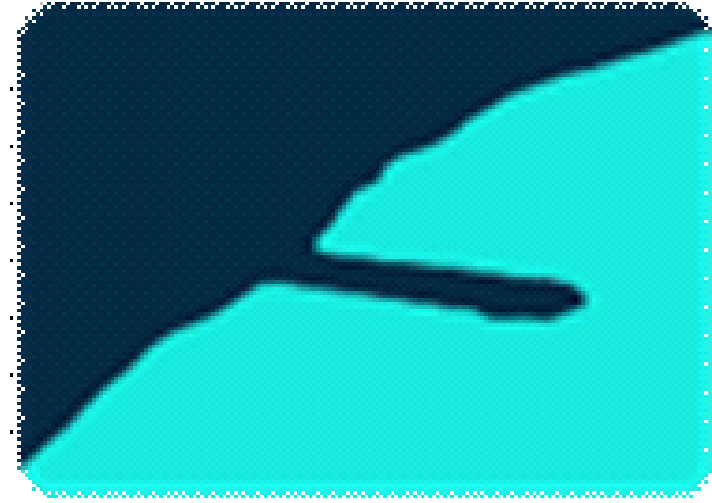

CONSORCIO CABO ROJO DEVELOPMENT

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
2059	1.15.2	Movimiento de Tierras	18 days	Wed 05 Jul '23	Tue 25 Jul '23
2063	1.15.3	Piscinas Edificio C	30 days	Sat 13 Jan '24	Fri 16 Feb '24
2090	1.15.4	Piscina Familiar Edificio D	54 days	Fri 08 Dec '23	Thu 08 Feb '24
2117	1.15.5	Piscinas Edificio E	40 days	Mon 01 Jan '24	Thu 15 Feb '24
2143	1.15.6	Piscinas Edificios F-G	39 days	Fri 24 Nov '23	Mon 08 Jan '24
2169	1.15.7	Piscina Familiar Edificio H	70 days	Wed 26 Jul '23	Sat 14 Oct '23
2196	1.16	OBRAS CIVILES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA	93 days	Thu 06 Jul '23	Mon 23 Oct '23
2197	1.16.1	<i>Hito</i>	<i>0 days</i>	<i>Thu 06 Jul '23</i>	<i>Thu 06 Jul '23</i>
2198	1.16.2	Registro de Inspeccion Drenaje Sanitario 1.5 x 1.5 mts (prof hasta 1.50m) - 32 Und	21 days	Wed 19 Jul '23	Fri 11 Aug '23
2204	1.16.3	Registro de Inspeccion Drenaje Sanitario 1.5 x 1.5 mts (prof 1.50@3.0m) - 24 Und	22 days	Wed 26 Jul '23	Sat 19 Aug '23
2210	1.16.4	Registro de Inspeccion Drenaje Sanitario 1.5 x 1.5 mts (prof mayor a 3.0m) - 3 Und	9 days	Thu 17 Aug '23	Sat 26 Aug '23
2216	1.16.5	Registros Pluviales	62 days	Sat 12 Aug '23	Mon 23 Oct '23
2221	1.16.6	Trampas de Grasa	10 days	Wed 04 Oct '23	Sat 14 Oct '23
2224	1.16.7	Imbornales	17 days	Wed 04 Oct '23	Mon 23 Oct '23
2227	1.16.8	Desarenador con Filtrante Ø10"	3 days	Thu 17 Aug '23	Sat 19 Aug '23
2229	1.16.9	Construcción de Cisterna Agua Cruda + Incendio (24.25 x 24.25 x 4.25 m) - 530,331 gal	39 days	Wed 19 Jul '23	Fri 01 Sep '23
2246	1.16.10	Construcción de Cisterna Agua Tratada (18.05 x 18.05 x 4.40 m) - 310,831 gal	65 days	Fri 07 Jul '23	Wed 20 Sep '23
2267	1.17	OBRAS CIVILES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	72 days	Tue 22 Aug '23	Tue 14 Nov '23
2268	1.17.1	<i>Hito</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 22 Aug '23</i>	<i>Tue 22 Aug '23</i>
2269	1.17.2	Obras Civiles de la Infraestructura Eléctrica	52 days	Fri 15 Sep '23	Tue 14 Nov '23
2281	1.18	SUB CONTRATOS	285 days	Tue 21 Mar '23	Thu 15 Feb '24
2282	1.18.1	<i>Hito</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 21 Mar '23</i>	<i>Tue 21 Mar '23</i>
2283	1.18.2	Comunicaciones	145 days	Wed 30 Aug '23	Wed 14 Feb '24
2486	1.18.3	Hidrosanitarias	285 days	Tue 21 Mar '23	Thu 15 Feb '24
4738	1.18.4	Aires Acondicionados	121.5 days	Wed 30 Aug '23	Thu 18 Jan '24
5003	1.18.5	Instalaciones eléctricas	261 days	Tue 21 Mar '23	Thu 18 Jan '24
5580	1.19	PRUEBAS Y ENTREGAS EN EDIFICIOS	188.5 days	Sat 15 Jul '23	Tue 20 Feb '24
5592	1.20	TERMINACIÓN PROYECTO / PRUEBAS DE OPERACIÓN	0 days	Tue 20 Feb '24	Tue 20 Feb '24
