



Fondo de Preparación del FCPF Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

REPUBLICA DOMINICANA

Julio 2017 – Julio 2018

v. 2018



Fondo de Preparación del FCPF: Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+

Sobre este documento

Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

Preparación del reporte

Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte detalladas indicador por indicador (<https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0>).

Cronograma de reporte

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el **15 de julio** de cada año.

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último año?
 - Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia
 - Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones que trabajaron en la redacción de la política

A continuación se detallan las actividades de la Fase Preparatoria para REDD+, realizadas en el periodo Julio 2017 – Julio 2018

1.1 Participación,, esfuerzos de colaboración interinstitucional y gobernanza.

1.1.1 Esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial (participación de otros ministerios en los Comités, capacitaciones)

Se han llevado a cabo esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial, entre los cuales cabe destacar la participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer. Estos ministerios han tomado parte en los asuntos propios de los organismos que componen la estructura de REDD+, destacándose las reuniones del Comité Directivo, donde se tratan temas de evaluación, retroalimentación y seguimiento.

Un total de 25 organizaciones de los sectores público, privado y academia participan en los trabajos desarrollados por el Comité Técnico Asesor.

En las actividades de capacitación han participado los siguientes actores: i) personal técnico del Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura, ii) Ministerio de Trabajo, iii) Ministerio de Hacienda, iv) Directores y personal Técnico de las Direcciones Provinciales, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, v) integrantes del Comité de Salvaguardas y del Comité de Asuntos Jurídicos vi) organizaciones locales que participaron en los talleres regionales de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental.

1.1.2 Fortalecimiento de la estructura de gobernanza


Se fortaleció la estructura de gobernanza de REDD+, con la conformación de dos nuevos grupos de trabajo, denominados Comité de uso de Suelos y el Comité Jurídico, los cuales tienen funciones consultivas y de apoyo al Comité Técnico Asesor (CTA), en la elaboración y/o revisión, ajustes y validación de documentos claves, para la implementación del Programa REDD+. El Comité Jurídico fue creado a través de un taller realizado el 4 de mayo del 2018, con la participación de las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Junta Agroempresarial Dominicana, Federación Dominicana de Municipios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como parte del fortalecimiento de la estructura de gobernanza, en marzo 2018, se realizó un taller con el Comité de Salvaguardas, donde se discutió el Plan de Participación y Consulta de SESA, se definió un plan de trabajo del Comité de Salvaguardas y se realizaron propuestas para la metodología de trabajo del Comité.

Asimismo, se realizó una revisión del estudio Análisis del marco legal dominicano, para determinar cómo éste aborda las salvaguardas de Cancún y las políticas operacionales del Banco Mundial. De la misma manera, se analizaron las instituciones responsables de poner en práctica las políticas o medidas relacionadas con las salvaguardas y cómo en la práctica estas se están cumpliendo. Para ello se utilizó el marco de interpretación legal de la Guía para comprender e implementar las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC y se partió de la revisión de análisis de reportes existentes.

Con la creación de los dos nuevos grupos de trabajo, la estructura organizativa para REDD+ quedó conforme se indica en la figura 1.

Figura 1. Estructura organizativa para REDD+ República Dominicana.

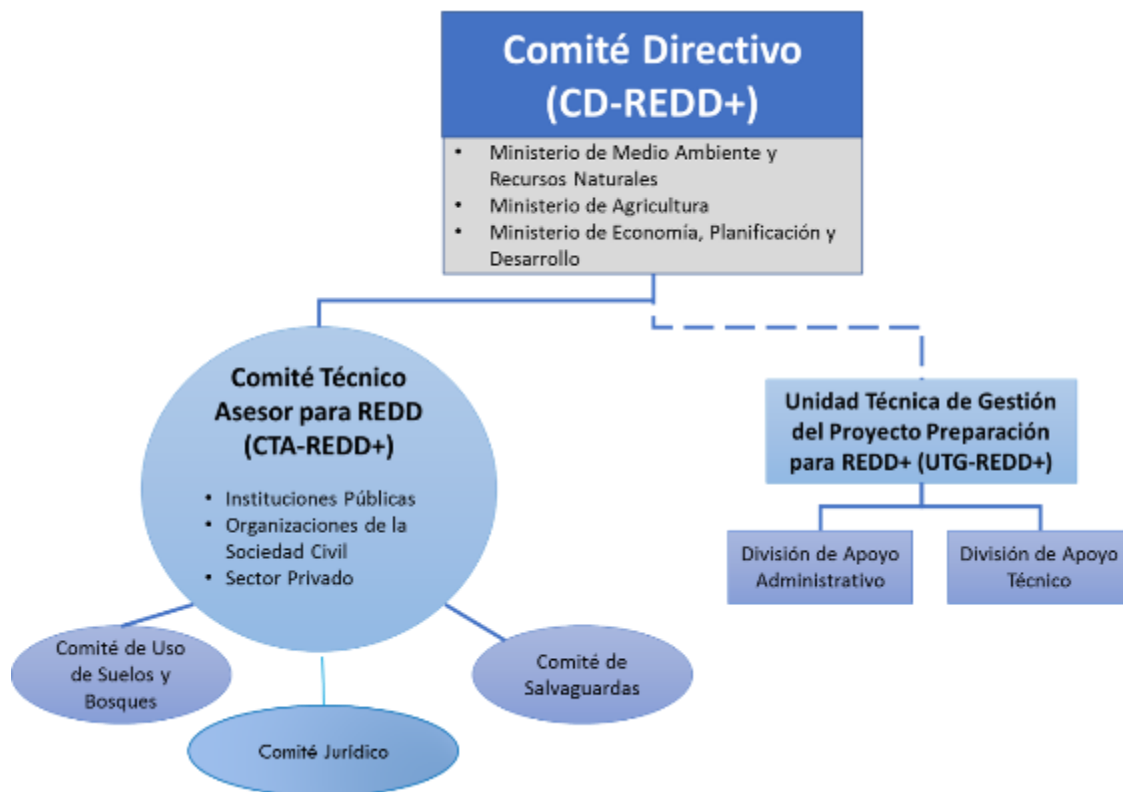

Asimismo, se realizaron reuniones ordinarias de trabajo del Comité Directivo (CD) en fecha 28 de noviembre 2017, así como del Comité Técnico Asesor en fecha 11 de agosto 2017 y 9 de febrero del 2018.

Los grupos de trabajo de Salvaguardas y Jurídico se reunieron en los meses de febrero y marzo 2018, logrando revisar y aprobar productos intermedios generados por los estudios Análisis de Causas Directas e Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques, así como del Análisis del Marco Legal, Institucional y de Cumplimiento de las Salvaguardas.



Foto 1. Reunión Comité Directivo, Nov. 2017



Foto 2. Reunión del Comité Técnico Asesor

También fue elaborado el documento inicial o propuesta de Mecanismo de Recepción de Quejas y Resolución de Conflictos (MQRC). El diseño final se tiene programado para octubre 2018.

1.2 Desarrollo de la Estrategia REDD+

Se realizaron los estudios y análisis para la identificación de los impulsores directos (drivers) e indirectos de la deforestación y degradación forestal y propuestas alternativas para reducir la deforestación y degradación de los bosques (DD).

Como resultado de las indicaciones del ER-PIN, así como también del estudio de drivers, y del criterio técnico de personal interministerial, se han identificado a nivel preliminar las siguientes **opciones estratégicas**:

- Fortalecer el marco legal e institucional para la conservación del patrimonio natural y el uso sostenible de los recursos naturales.
- Establecer, fortalecer, armonizar y aplicar políticas públicas para limitar y/o contener la expansión de la frontera agrícola, ganadera y de infraestructura en áreas boscosas,
- Promover modelos de gestión sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a la conservación y el aumento de la cobertura boscosa del país.

Estas opciones o medidas estratégicas para combatir las causas de la deforestación y degradación de los bosques, fueron analizadas y validadas mediante procesos participativos, con la intervención de los distintos grupos de actores vinculados al uso y cambio de uso de la tierra. Las mismas van a ser consensuadas y validadas nuevamente durante la fase de formulación de la Estrategia Nacional REDD+.

Otros estudios necesarios para la Estrategia REDD+ fueron iniciados, y se encuentran en fase de desarrollo, entre los cuales se encuentra “Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para el Programa de Reducción de Emisiones” y “Determinación de los derechos del carbono forestal y transferencia de títulos de reducción de emisiones”, los cuales finalizarán en los próximos dos meses.

1.3 Desarrollo de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y Niveles de Referencia Forestal (NRF)

Se realizaron estudios básicos para establecer el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y el Nivel de Referencia Forestal (NRF), tal como la serie histórica de Mapas de uso y cambio de uso de la tierra 2005, 2010 y 2015, y se avanzó en la ejecución de la segunda fase del Inventario Forestal Nacional y el Inventario de Cobertura de No Bosque. Estos inventarios se encuentran en un nivel de avance de 83% y 66% de avance, respectivamente.



Foto 3. Inventario de No bosque (unidad de cacao). Fotos 4 y 5 Inventario de bosque (bosque latifoliado y Mangle enano)

El nivel de referencia servirá no sólo para efectos propios del mecanismo REDD+. sino que, en la medida de lo posible, cumplirá también con obligaciones del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático.

2. Actividades de creación de conciencia, capacitación de actores y consultas.

A continuación se detallan las actividades de creación de conciencia, capacitación y consulta desarrolladas con grupos de actores: gobierno, sector privado/productores, academia y sociedad civil

2.1 Actividades de creación de conciencia

2.1.1 **Realización de cuatro talleres de sensibilización sobre REDD+ Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), el Marco de Gestión Ambiental (MGAS) y el Mecanismo de Quejas y Resolución de Conflictos** con el personal técnico de las Direcciones Provinciales y municipales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las fechas 18-10-17, 01-11-17, 08-11-17 y 30-01-18 Participaron 95 personas, 61 hombres y 34 mujeres, procedentes de 32 provincias y 12 municipios.

Talleres de sensibilización sobre REDD+ a las Direcciones Provinciales y Municipales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Foto 6. Taller en Santiago



Foto7. Taller en San Francisco de Macorís



Foto8. Taller en Azua



Foto9. Taller en Santo Domingo

2.1.2 **Un taller de sensibilización sobre REDD+ y el alcance del proyecto Preparación para REDD+** a personal de diferentes departamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en fecha 19-00-17. Participaron 31 personas, 17 hombres y 14 mujeres.


2.1.3 **Una reunión de sensibilización sobre REDD+ y el alcance del proyecto**, para técnicos del Ministerio de Agricultura, en fecha 14-03-18. Participaron 23 personas, 18 hombres y 5 mujeres.



Foto10. Reunión con técnicos del Ministerio de Agricultura

2.1.4 **Reunión de sensibilización sobre REDD+ con productores y comunitarios, en fecha 01-12-17, con la participación de 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres.**

2.1.5 Previa a la realización de los talleres SESA, en el período comprendido entre el 17 de abril al 03-05-18 se realizaron **9 reuniones de sensibilización y motivación de actores de los sectores privado/productores, gobierno y sociedad civil** procedentes de 18 localidades (provincias/municipios) del país, en los cuales participaron 49 personas, 43 hombres y 6 mujeres. La representación de los sectores en dichos talleres fue de: 15 organizaciones del Sector Privado/Productores, 10 organizaciones de la Sociedad Civil y 24 dependencias del Gobierno (Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Agricultura).



2.2 Actividades de creación de capacidades.

2.2.1 **Capacitación a los miembros del Comité de Salvaguardas en el marco de la ENREDD+ y Salvaguardas de Cancún**, impartido por PRCC/CARE en fecha **18-04-18**. **Participaron 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres.**

2.2.2 **Capacitación de los miembros del comité jurídico**, realizada en fecha 04-05-18 con la participación de 16 personas, 7 hombres y 9 mujeres, representantes de entidades de gobierno, academia y sociedad civil. El taller abarcó temas relativos a los derechos del carbono, Fondo de Carbono, enfoque de visión mundial, conceptos legales y regulatorios, así como el establecimiento de los próximos pasos.

2.2.3 **Capacitación sobre “Procesamiento, análisis e interpretación de datos del Inventario Nacional Forestal”** realizado del 26 al 28 de junio 2018, con la participación de 11 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (6 hombres y 5 mujeres).

2.3 Actividades de consulta con múltiples actores

2.3.1 **Talleres participativos para acordar una definición de bosque en el contexto REDD+**. Se realizaron 2 talleres en fecha 11-08-17 y 09-02-18, que sumaron la participación de 84 personas, 49 hombres y 35 mujeres.



Foto 11. Segundo taller definición de bosque




Foto 12. Tercer taller definición de bosque

2.3.2 **Talleres participativos para el Análisis de los impulsores directos e indirectos de la deforestación, propuestas de alternativas para combatir las causas de la deforestación y degradación de los bosque y análisis de riesgos de reversión.** Se realizaron 4 talleres regionales y un taller nacional entre el 06 de marzo y 18 de abril 2018, con la participación de 199 personas, 149 hombres y 50 mujeres.



Foto 13 Taller de consulta análisis de los impulsores de deforestación y propuestas de alternativas para combatirlos.

Gráfico 2. Participación de actores relevantes en talleres de análisis de impulsores de la deforestación, por género



2.3.3 **Taller participativo del Sector Privado en el Desarrollo Forestal y Agroforestal**, realizado el 10-04-18, con la participación de **33 personas, 23 hombres y 10 mujeres**, representantes del sector privado, gobierno y sociedad civil.

2.3.4 **Talleres participativos para la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA)**. Se realizaron **8 talleres regionales** durante los meses de **mayo y junio 2018**, con la participación de **301 personas, 203 hombres y 98 mujeres**, representantes de los sectores privado/productores, gobierno, academias y sociedad civil.

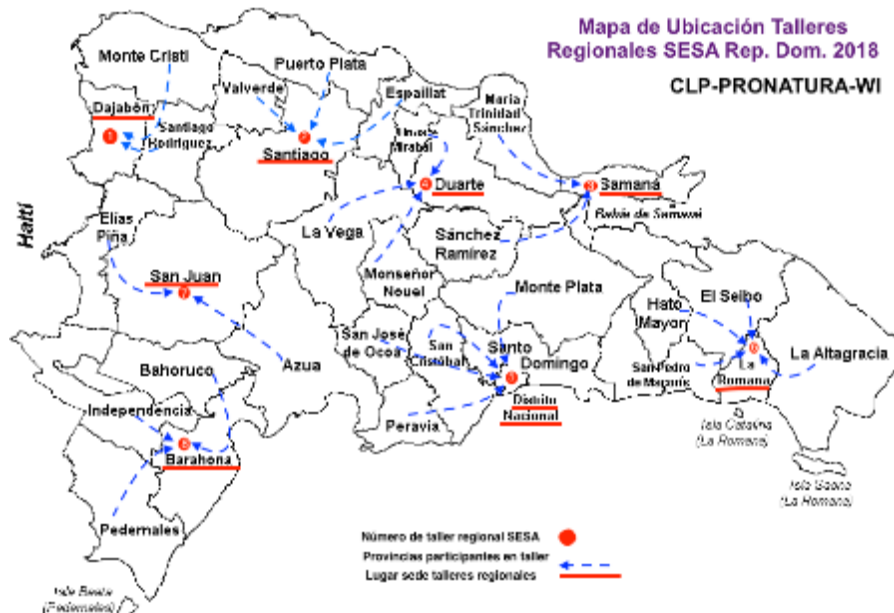


Figura 2. Ubicación Talleres SESA

Gráfico 3. Participación de actores relevantes por sector





Grafico 4. Participacion de actores relevantes por género.



3. Fortalecimiento institucional. .

El Proyecto Preparación para REDD+ continua fortaleciendo las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros actores involucrados, a través de la adquisición de 130 equipos tecnológicos y software's (Paquete de MS Office), con una inversión a la fecha de USD133,020.25, los cuales se detallan a continuación:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

- **Direcciones Provinciales y Municipales del Ministerio de Medio Ambiente:** 43 Desktop y 43 UPS (1 por cada Dirección). Estos equipos permitirán viabilizar la implementación del Mecanismo de Quejas y Resolución de conflictos.
- **Dirección de Cambio Climático y UTG:** 10 Desktop, 4 Laptops, 1 Cámara fotográfica y 1 Proyector.
- **Unidad de Monitoreo Forestal:** 3 Desktop, 5 UPS y 1 impresora multifuncional.
- **Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales (DIARENA):** 4 Desktop, 1 Laptop, 1 impresora multifuncional, 1 Plotter, 1 Cámara y 4 Discos Duros.
- **Dirección de Participación Social:** 1 Laptop.
- **Dirección de Comunicaciones y Eventos:** 1 Desktop.

Otros actores involucrados:

- **Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET):** 5 Desktop y 1 Servidor.


Con estos equipos y software's se facilitará el trabajo de algunas dependencias del Ministerio que estarán apoyando al Proyecto Preparación para REDD+, como son las Direcciones Provinciales y Municipales en la recepción de las denuncias ambientales que incluirán las de REDD+, el trabajar de DIARENA en la elaboración de mapas y otros actores como ONAMET en la creación de escenarios climáticos.

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?

- Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado

- a) Se logró realizar parte de estudios básicos para la formulación de la Estrategia REDD+, tales como: Análisis de las causas directas e indirectas (Drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) y se formularon a nivel preliminar las opciones estratégicas o instrumentos de políticas públicas para reducir la deforestación y degradación (DD).
- b) Se logró avanzar en los estudios básicos para el cálculo del nivel de referencia (NR), tales como: Serie histórica de mapas de uso y cobertura del suelo 2005, 2010 y 2015, análisis de cambio y deforestación, en la República Dominicana. Asimismo se registró un avance importante en la ejecución de los inventarios de cobertura de bosque y de no bosque los cuales alcanzaron el 83% y 66% respectivamente
- c) Se realizó la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) a las alternativas propuestas, para reducir la deforestación y degradación de los bosques.
- d) **617** representantes de organizaciones del sector privado, gobierno y sociedad civil participaron en los procesos de consulta de REDD+, **424** hombres y **193** mujeres.

Grafico 5. Participación de actores relevantes en los talleres de participación y consulta según género

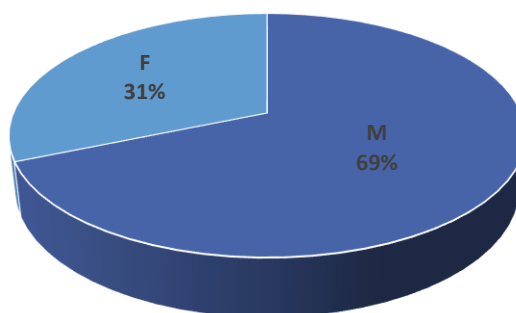

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?

- Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

- En la fase preparatoria para REDD+, experimentamos algunos desafíos para llevar a cabo los procesos administrativos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido principalmente al tiempo de familiarización de los procesos por parte del equipo técnico y administrativo, cambios de autoridades en la institución y demoras en el tiempo de respuesta por parte del personal del Banco. Esto último se evidenció en la fase inicial del proyecto.
- De igual modo, destacamos el nivel de esfuerzo demandado, por la realización de manera simultánea, de la mayoría de los estudios básicos para la elaboración de la Estrategia REDD+. Esto se evidencia en el arduo trabajo y tiempo consumidos en los procesos asociados, tales como: la elaboración de términos de referencia (TdRs), solicitud de expresiones de interés, evaluación de propuestas técnicas y financieras, selección y contratación de personal y el seguimiento a cada uno de los procesos de parte del personal de la Unidad Técnica de Gestión.

4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo año?

- Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

- Terminar de definir el Mecanismo de Quejas y resolución de conflictos, así como su reglamento operativo
- Completar el diseño del MGAS.
- Terminar de definir el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)
- Elaborar el Nivel de Referencia Forestal (NRF) y y Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)
- Elaborar la estrategia REDD+
- Completar el estudio Propiedad del carbono forestal y transferencia de títulos de reducción de emisiones

- g) Realizar los estudios para determinar titularidad de la tierra y una propuesta de instrumento jurídico para arreglar la distribución de beneficios del carbono
- h) Definir el sistema MRV Forestal
- i) Continuar fortaleciendo la gobernanza para REDD+
- j) Realizar las consultas de los resultados de los estudios que están actualmente en desarrollo.

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:

(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:

Terminado	El subcomponente ha sido terminado
	Avance considerable
	Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
	Se necesita continuar el desarrollo
	Todavía no demuestra avance
N/A	El subcomponente no se aplica a nuestro proceso

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación			
Subcomponente 1a: Arreglos de Gestión Nacional de REDD+	Terminado	Para la gestión nacional REDD+ se han establecido cuatro (4) plataformas de participación y consulta: i) Comité Técnico Asesor (CTA), ii) Comité de Salvaguardas, iii) Comité de Uso de Suelo, Agricultura y Bosque, iv) Comité de Asuntos Jurídicos. Cada una de estas instancias cuenta con sus funciones propias y participan principalmente en la validación de productos clave de los estudios básicos de preparación para REDD+.	
			x
Subcomponente 1b: Consultas, participación y divulgación	Terminado	Se cuenta con un borrador de <i>Estrategia de Comunicación Nacional para REDD+</i> para un grupo meta variado que incluye: i) comunidades dependientes de los bosques, ii) tomadores de decisión, iii) sector privado, iv) sociedad civil, v) gobierno central y local. Dicha estrategia contempla también propuesta de mejora a la plataforma web del proyecto. Asimismo, se han realizado 16 talleres regionales y nacionales para consulta y participación en; i) la <i>Determinación de las Causas Directas e</i>	
			x

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
		<p><i>Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques</i> (estudio drivers DD), ii) <i>Evaluación Estratégica Ambiental y Social</i> (SESA). Está en curso el estudio <i>Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para REDD+</i>, el cual contempla, entre otros, el desarrollo de un <i>Mecanismo de Quejas y Resolución de Conflictos</i> (MQRC) y un <i>Sistema de Información de Salvaguardas</i> (SIS).</p>
Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+		
<p>Subcomponente 2a: Evaluación sobre el uso de suelo, factores de cambio de uso del suelo, ley forestal, política y gobernanza</p>	Terminado	
		x
<p>Subcomponente 2b: Opciones de estrategia de REDD+</p>	Terminado	
		x
<p>N/A</p>		<p>Se realizó un estudio detallado sobre <i>serie histórica 2005, 2010, 2015 del uso y cambio de uso del suelo</i> del país. También, en el estudio <i>Determinación de las Causas Directas e Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques</i> se analizaron: i) los factores de cambio de uso de suelo, ii) la normativa forestal, iii) la política y gobernanza forestal. Dicho estudio analizó también: i) casos exitosos de modelos forestales sostenibles en el país, ii) políticas públicas y leyes que inducen la deforestación y degradación y el no aumento de reservas de carbono forestal o <i>barreras</i> que evitan generar los incentivos para reducir la DD.</p> <p>Partiendo de los resultados del estudio <i>serie histórica 2005, 2010, 2015 del uso y cambio de uso del suelo</i> y del estudio <i>drivers de DD</i> está en marcha la consultoría <i>“Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para el Programa de Reducción de Emisiones en República Dominicana.”</i> Entre los principales objetivos de esta consultoría figuran: i) identificar y cuantificar los costos y beneficios asociados a las actividades de un programa de ER, ii) identificar fuentes de financiación y arreglos necesarios v) preparar un plan de financiación.</p>

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)	
	<div style="background-color: red; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: black; height: 380px; width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N/A</div>	<p><u>Opciones Estratégicas</u> o instrumentos de políticas públicas para reducir la deforestación y degradación de los bosques y el aumento de reservas de carbono forestal. La determinación de opciones estratégicas REDD+ conllevó: i) Identificar retos y oportunidades para armonizar las políticas nacionales que inciden en el uso de la tierra y que contribuyan a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques, así como al uso sostenible de la tierra, ii) proponer instrumentos de política intersectorial para reducir la deforestación y degradación, con énfasis en la agricultura y el pastoreo, y los arreglos institucionales necesarios. Las opciones estratégicas presentadas en el estudio drivers de DD han sido analizadas/mejoradas y se cuenta con un <i>borrador avanzado</i> que servirá de base para la formulación de la Estrategia Nacional REDD+, la cual está contratada y en fase de ejecución. Del proceso participativo de la formulación de dicha estrategia saldrán las Opciones Estratégicas REDD+ consensuadas a nivel nacional.</p>	
<p>Subcomponente 2c: Marco de implementación</p>	<div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">Terminado</div>	<p>Está en curso la consultoría <i>Propiedad del Carbono Forestal, Naturaleza Jurídica y Transferencia de Títulos de Reducción de Emisiones en República Dominicana</i>. Los objetivos específicos de este estudio son:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Examinar y esclarecer los regímenes de propiedad de la tierra, de bienes y servicios existentes en áreas forestales y del derecho del carbono forestal, según la legislación y normativa vigente en República Dominicana. ii. Examinar e identificar la naturaleza jurídica de las reducciones de emisiones, su existencia jurídica en la legislación nacional y las adaptaciones legales adecuadas para crear, emitir, registrar y transferir las reducciones de emisiones. iii. Evaluar la capacidad legislativa y normativa del país para crear y/o transferir internacionalmente los títulos de Reducción de Emisiones. iv. Identificar mecanismos factibles para, emitir, registrar y transferir títulos de Reducción de Emisiones de manera efectiva y transparente. 	
	<div style="background-color: green; height: 15px; width: 100%;"></div>		
	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>		x
	<div style="background-color: lightblue; height: 15px; width: 100%;"></div>		
	<div style="background-color: red; height: 15px; width: 100%;"></div>		
	<div style="background-color: black; height: 300px; width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">N/A</div>		

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
		Ya se cuenta con productos intermedios de este importante estudio.
Subcomponente 2d: Impactos sociales y ambientales	Terminado	<p>Está en fase final el estudio <i>Análisis del Marco Legal, Institucional y de Cumplimiento de Salvaguardas</i>. Asimismo, está en ejecución la consultoría <i>Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para REDD+</i>. Como parte del MGAS se desarrolló la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA). Entre los productos esperados del MGAS tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Plan de participación y consulta. ii. Sistematización de resultados de los talleres SESA. iii. Marco para la gestión ambiental y social. iv. Mecanismo de quejas y resolución de conflictos. v. Propuesta de sistema de información de salvaguardas. <p>Está en proceso de formulación los TdR del estudio <i>Arreglos para la Distribución de Beneficios</i>.</p>
	x	
	N/A	
Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia		
Componente 3: Niveles de emisiones de referencia o niveles de referencia	Terminado	<p>Está en proceso la firma de contrato para la realización del estudio <i>Establecimiento de Nivel de Referencia, Estimación del Potencial de Reducciones de Emisiones/Aumento de Reservorios y Sistema Básico de Monitoreo de Emisiones Forestales en República Dominicana</i>, para una duración de servicio de tres (3) meses. Los principales resultados esperados de este estudio son:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Construcción de nivel de referencia de emisiones asociadas a REDD+, con estructura y contenido acorde a guías del IPCC y marco metodológico del FCPF, y siguiendo los capítulos y subcapítulos del ERPD. ii. Diseño básico de sistema de medición, reporte y verificación (MRV) forestal para fines de REDD+ (capítulo 9, FCPF-ERPD).
	x	
	N/A	
Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas		
	Terminado	

Subcomponente	Calificación de avance (marcar con "X" donde corresponda)	Evaluación narrativa (explique brevemente su calificación)
Subcomponente 4a: Sistema nacional de vigilancia forestal		Se encuentra en fase final el estudio <i>Elaboración del Inventario Nacional Forestal de la República Dominicana (INF-RD)</i> , el cual consiste en: i) ejecutar el muestreo de campo en los diferentes estratos (tipos de bosques) propuestos para la (fase II) del inventario, ii) determinar la dasometría y existencias (volumen, biomasa y carbono) por tipos de bosque, iii) realizar el procesamiento, análisis e interpretación de los datos levantados en las fases I y II del inventario. Además, se está ejecutando el estudio <i>Evaluación del Contenido de Biomasa y Carbono en Cobertura de No Bosque (café-Coffea sp, cacao-Theobroma cacao, aguacate-Persea americana, mango-Mangifera indica, coco-Cocos nucifera y matorral seco) en República Dominicana.</i>
	x	
	N/A	
Subcomponente 4b: Sistema de información para beneficios múltiples, otros impactos, gobernanza y salvaguardas	Terminado	Está previsto, pero aún no ha iniciado la determinación de indicadores relacionados con beneficios; i) priorización de co-beneficios que serán monitoreados, ii) ficha técnica de los indicadores a monitorear (periodicidad, tipo de información, procedencia de información)
	x	
	N/A	

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a **conservar y mejorar los medios de subsistencia** (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está **orientado explícitamente a los medios de subsistencia**; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono **incorpora explícitamente los medios de subsistencia**)?

(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apunten directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí	<input type="checkbox"/>	(borrar según corresponda)
----	--------------------------	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque:

Como parte de la Estrategia Nacional REDD+ se tiene contemplado la opción estratégica "Promover modelos de gestión sostenible de los recursos naturales que contribuyan a la conservación, uso sostenible de los bosques y el aumento de la cobertura boscosa del país". Dentro de las líneas de acción de esta opción estratégica figuran de manera específica las siguientes:

- Fortalecimiento y ampliación del programa nacional de desarrollo agroforestal.

- Programa de manejo de fincas agrícolas y ganaderas que incorpore sistemas agroforestales con productos de alto rendimiento, especialmente en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.

Además de reservorios de carbono, ambas líneas de acción contribuirán a mejorar los medios de vida de comunidades rurales y productores locales a través de la producción pecuaria y agroforestal. Dentro de las áreas geográficas priorizadas de intervención REDD+ figuran zonas con alto potencial para el desarrollo agroforestal.

La Estrategia Nacional REDD+ está en fase de formulación y profundizará sobre el enfoque y alcance de la conservación y mejoría de los medios de vida por las acciones REDD+.

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora explícitamente la conservación de la biodiversidad)?

(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apunten directamente a conservar la biodiversidad)

Sí		(borrar según corresponda)
----	--	----------------------------

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación que describa su enfoque.

Como se mencionó anteriormente, la Estrategia Nacional REDD+ está en fase de formulación y dentro de las opciones estratégicas ya se ha contemplado **Fortalecer el marco legal e institucional para la conservación del patrimonio natural y el uso sostenible de los recursos naturales**. Entre sus líneas de acción se ha identificado definir y poner en práctica instrumentos y mecanismos financieros para desarrollar actividades productivas, de **conservación y restauración de ecosistemas forestales**. La conservación y restauración de ecosistemas forestales lleva implícito beneficios para la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad será uno de los co-beneficios a ser monitoreados, para lo cual se definirán indicadores apropiados, periodicidad y tipo de información requerida. Por su condición de isla, la conservación de la biodiversidad del país ha sido considerada de alta prioridad a nivel de políticas ambientales. La Estrategia Nacional REDD+ contempla también como línea de acción el **fortalecimiento del programa de protección y vigilancia en áreas protegidas**.

SECCIÓN D: FINANZAS

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante (no confirmado) o las contribuciones en especie:

(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, préstamos)

Monto (USD)	Fuente	Fecha comprometida (MM/AA)	¿Financiamiento público o privado?	¿Subvención, préstamo u otro?
----------------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

	(por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)		(Borrar según corresponda)	(Borrar según corresponda)
--	--	--	----------------------------	----------------------------

\$845,000	GIZ	01/2011	Público	Subvención
\$85,000	ONU	03/2015	Público	Subvención
\$202,769	USAID	07/2013	Público	Subvención
\$3,800,000	FCPF	10/2015	Público	Subvención

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto (USD)	Fuente (por ejemplo, FCPF, FIP, nombre de oficina de gbno.)	¿Financiamiento público o privado? (Borrar según corresponda)	¿Subvención, préstamo u otro? (Borrar según corresponda)
\$432.000	Gobierno Dominicano	Público	Otro

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF

10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+				X	
El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de REDD+					X
El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la participación sustancial de múltiples actores (a saber, mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+					X

Comentarios / aclaraciones, si procede:**11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:**

(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con "X" donde corresponda

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Accedemos con frecuencia a productos de conocimiento del FCPF para obtener información relacionada con REDD+					X
Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes para nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes para abordar todos nuestros requisitos de información relacionada con REDD+				X	
El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a información relacionada con el FCPF y con REDD+				X	

Comentarios / aclaraciones, si procede:**SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES****12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de REDD+ durante el año pasado:**

Los estudios iniciados en el periodo reportado, estan programados para finalizar en tres meses, y sus resultados serán los insumos para completar el documento del Programa de Reduccion de Emisiones del pais, a presentarse al FCPF en noviembre 2018.
