

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual update)

COUNTRY: República Dominicana
PERIOD: Agosto 2016 -Julio 2017

Background: This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework (PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should provide the FCPF's Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries' progress towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E Framework.

Report preparation: Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + (component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the country report.

Reporting schedule: It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the FMT by July 15th each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of this country reporting will also be submitted by March 15th each year.

1. SUMMARY OF REPORT

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period should also be provided (key bullets only).

SUMMARY

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO, POR COMPONENTE:

1. Organización y consulta para la preparación REDD+

1a. Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+

Se amplió la plataforma consultiva para REDD+ e inició sus operaciones, con los siguientes logros en el periodo reportado:

- Creación del Comité Técnico Especial sobre Salvaguardas.
- Una (1) reunión del Comité Directivo.
- Dos (2) reuniones del Comité Técnico Asesor realizadas.
- Dos (2) talleres de capacitación del Comité de Salvaguardas

1b. Consulta, participación y difusión social.

Se inició el proceso de licitación para contratar la firma consultora que diseñará la estrategia de comunicación nacional para REDD+. Actualmente, los TdRs se encuentran en fase de revisión.

1c. Procesos de Consulta y Participación

- Se elaboraron los términos de referencia (TdR) para la contratación de la firma consultora que se encargará de reformular el Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos (MQRC). Actualmente en fase de revisión.
- Se concluyó el proceso de licitación de los equipos de cómputos que se destinarán para fortalecer las entidades vinculadas al proyecto del (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Oficina Nacional de Meteorología).
- Se elaboró un plan para la capacitación y sensibilización de las direcciones provinciales y oficinas municipales.

2. Desarrollo de la estrategia REDD+

- Se elaboraron los TdR para los estudios de profundización en el “Análisis de las causas directas e indirectas (Drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD)”, así como la formulación de ‘Propuestas de alternativas de uso sostenible del suelo, que disminuyen la DD y aumentan los reservorios de carbono. Actualmente en fase de licitación.
- Se están elaborando los TdR para la contratación de la consultoría que estará a cargo de desarrollar el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los talleres de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA).

5. Monitoreo y Evaluación (M&E) Marco y Administración de Subvención.

- Se seleccionó y contrató al personal técnico y administrativo de la Unidad Técnica de Gestión (UTG) como se describe a continuación: Coordinadora del Proyecto, Especialista Financiero, Especialista en Adquisiciones, Especialista en Suelos, Especialista Social, Encargado de Operaciones, Secretaria Administrativa y Choferes/apoyos logísticos. Aún falta contratar a los especialistas legales y de comunicaciones, así como los técnicos forestal y social.
- Se realizó la adecuación de la oficina para la Unidad Técnica de Gestión y la adquisición del mobiliario correspondiente.
- Se licitaron los equipos tecnológicos para la UTG.

II. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

Se han presentado dificultades que inciden en el retraso de las actividades de la fase de preparación de REDD+, relacionadas con:

- a) **Conformación UTG-disponibilidad personal profesional.**
- b) **Desconocimiento de informaciones sobre el mercado y algunos aspectos técnicos de los bienes y servicios adquiridos.**
- c) **Escasa oferta nacional para los estudios básicos del proyecto**
- d) **Coordinación interinstitucional**

III. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEMESTRE JULIO – DICIEMBRE 2017.

1. Organización y consulta para la preparación REDD+

1a. Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+

- Una reunión ordinaria del CD
- 4 reuniones ordinarias del CTA
- Conformación de al menos dos comités especiales, dentro del marco del CTA.

1b. Consulta, participación y difusión social

- Contratación del Especialista en Comunicaciones;
- Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Diseño de una estrategia de comunicación nacional para REDD+ más análisis y propuesta de mejora a plataforma web del proyecto”;
- Iniciar Implementación de la estrategia de comunicación nacional para REDD+

1c. Procesos de Consulta y Participación.

- Realizar el proceso de licitación y contratación para la consultoría “Diseño del Mecanismo de Quejas y Resolución de Conflictos (MQRC)”¹
- Ejecutar el Plan de capacitación (7 talleres) sobre el Programa REDD+ de las Direcciones Provinciales y Municipales.
- Realizar diez (10) talleres para la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA).
- Continuar avanzando con el programa de Capacitación para el Grupo Facilitador de Salvaguardas.

2. Preparación de la Estrategia REDD+

2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión.

- Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Análisis de causas directas e indirectas (drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) en República Dominicana.
- Concluir con el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Elaboración de mapas de uso y cobertura del suelo 2015, análisis de cambio de uso de suelo y deforestación, en la República Dominicana”.
- Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Marco Legal, Institucional y de Cumplimiento para las Salvaguardas de la CMNUCC y las OP del Banco Mundial”.
- Concluir con el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para el Programa de Reducción de Emisiones en República Dominicana”.
- Concluir el proceso de licitación e iniciar la Consultoría para el desarrollo del Marco de

¹ Esta consultoría se realizará empaquetada junto con el MGAS, SIS y Talleres SESA.

Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) para REDD+.

2b. Opciones de Estrategia de REDD+

- Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Propuestas de alternativas de uso sostenible del suelo que disminuyen la DD y aumentan los reservorios de carbono”².

2c. Marco de ejecución.

- Concluir el proceso de licitación para la contratación de la consultoría “Propiedad del carbono forestal, sistema de registro y transferencia de títulos de reducción de emisiones en República Dominicana”.
- Análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento para las salvaguardas de REDD+

3. Niveles de referencia de las emisiones / niveles de referencia Forestal

- Elaborar los términos de referencia para la consultoría “Desarrollo y envío del nivel de referencia (REL/FREL) a la UNFCCC. Generar factores de expansión y/o ecuaciones alométricas por tipo de bosque”.

4. Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas.

4a. Sistema de seguimiento forestal nacional.

- Concluir el proceso de licitación para la contratación de la firma que realizará la segunda fase del Inventario Nacional Forestal de la República Dominicana (INF-RD).
- Elaborar términos de referencia (TdR) como fase inicial de la licitación consultoría “Desarrollo de un Sistema de seguimiento forestal (MRV)”, así como concluir con la misma.

4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas.

- Elaborar los términos de referencia (TdR) como fase inicial de la licitación de la consultoría “Desarrollo de un Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas”, así como concluir con la misma.

5. Monitoreo y Evaluación (M&E) Marco y Administración de Subvención

- Concluir el proceso de licitación de los vehículos del proyecto (LN-02-2017).
- Concluir el proceso de licitación para la auditoría externa.
- Contratación de Especialista Legal, Técnico Forestal y Técnico Social.
- Informe de progreso al FCPF.

² A realizarse junto con la consultoría de Drivers de deforestación.

2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention “does not apply – n/a”.

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (FCPF M&E Framework Indicator 1.2.B.i.):

<u>Source:</u> GIZ	<u>Amount provided:</u> USD\$845,000.00
<u>Source:</u> Dominican Republic's Government	<u>Amount provided:</u> USD\$432,000.00
<u>Source:</u>	<u>Amount provided:</u>


Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (FCPF M&E Framework Indicator 1.2.B.i.):


<u>Source:</u> USAID –Climate Change Regional Program	<u>Amount provided:</u> USD\$48,160.84
<u>Source:</u> UN - REDD	<u>Amount provided:</u> USD\$85,000.00
<u>Source:</u>	<u>Amount provided:</u>

Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes (FCPF M&E Framework Indicator 1.3.A):

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at the national level.

Las partes interesadas del Programa Nacional REDD+ participan en los procesos de toma de decisiones, a través de los organismos de los cuales forman parte. Estos son: Comité Directivo, Comité Técnico Asesor y los Comités Especiales por áreas temáticas. En el periodo reportado se conformó el Comité de Salvaguardas. Los esquemas siguientes muestran cómo los diferentes actores están representados en la estructura organizativa de REDD+. También, en el periodo reportado se incorporó un nuevo actor que es el Ministerio de la Mujer. La UTG trabaja actualmente en el fortalecimiento de la participación de los miembros del CTA y su empoderamiento.

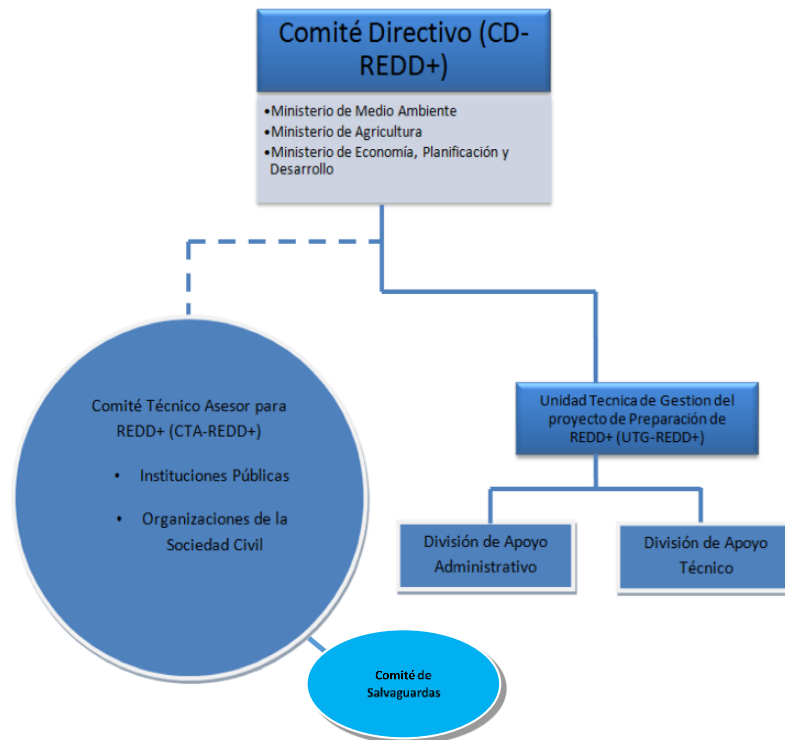

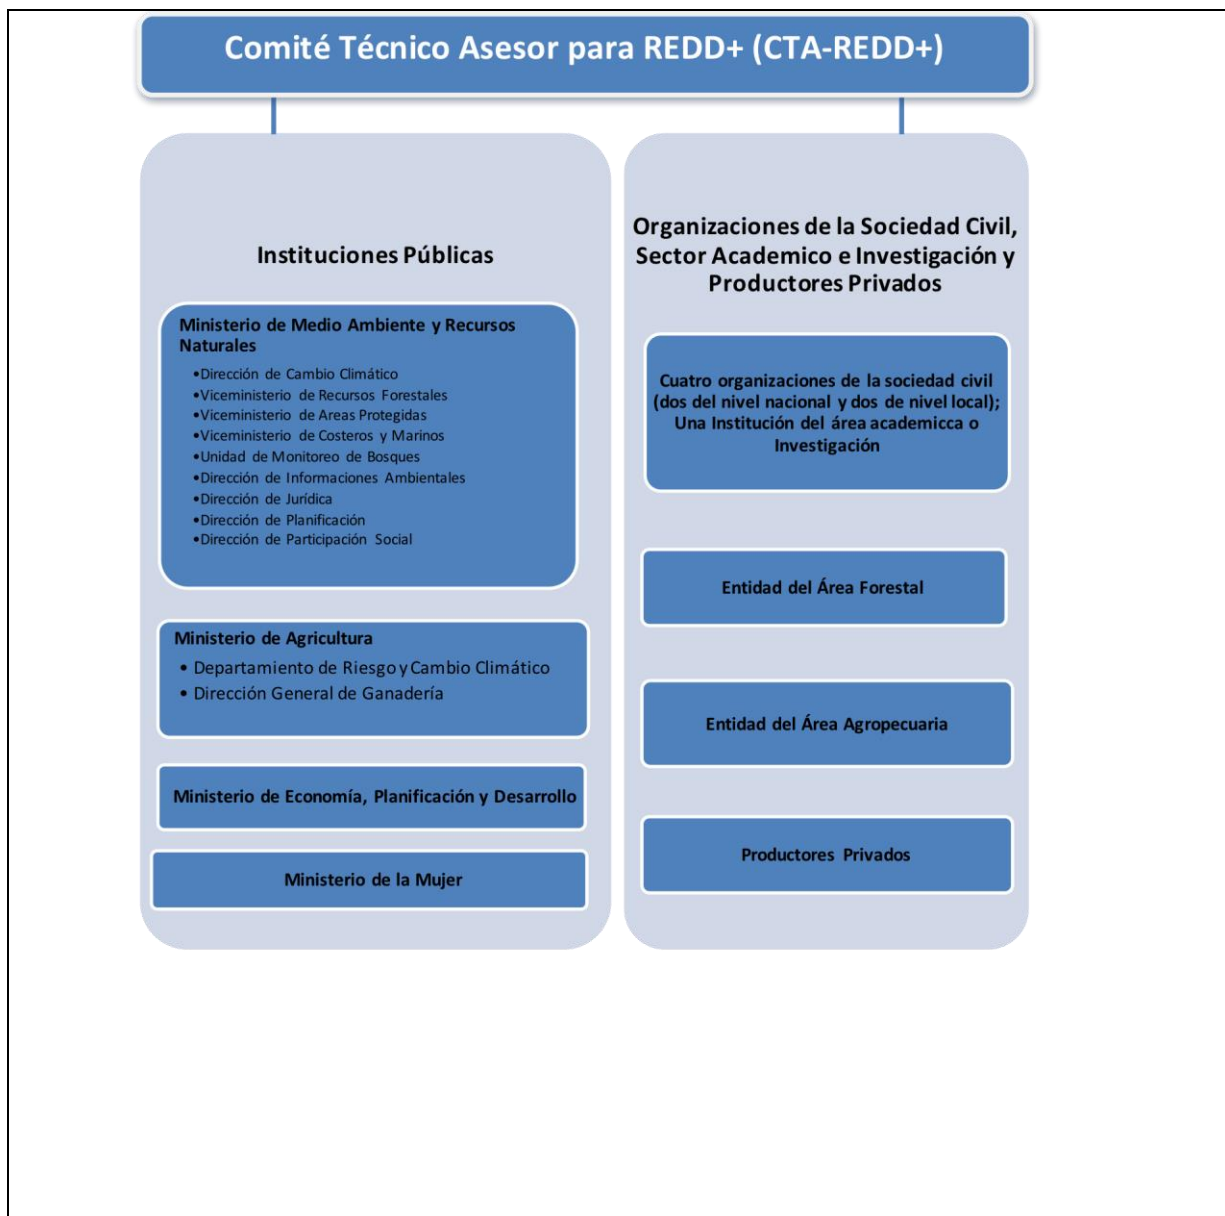

Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and provide inputs to the REDD+ readiness process (FCPF M&E Framework 3.2.a.):

<p><u>Frequency:</u></p> <p>2 reuniones/año para el Comité Directivo</p> <p>6 reuniones/año del CTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un reunión realizada en enero 2017 2. Dos (2) reuniones del Comité Técnico Asesor realizadas en Abril y Junio
---	---

Examples of resources made available to enable active participation of IPs , CSOs and local communities in national REDD+ readiness.

En el Presupuesto para la preparación de REDD+ se asignaron fondos (US\$300k) para el desarrollo del MGAS, el MQRC y por consiguiente los talleres SESA (25 planificados y 10 a realizarse en el próximo semestre). En estos procesos participativos los actores de REDD+, incluyendo las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, tienen la oportunidad de incidir en la toma de decisiones sobre la Estrategia Nacional REDD. Asimismo, en el periodo reportado se recibió un aporte de US\$38,195.88 de parte de USAID a través de CARE. Este fue destinado a las actividades de conformación y capacitación del Comité de Salvaguardas.

Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.):

Number of policy reforms during the reporting period that are: No aplica para éste período.

Underway:

Completed:

Please describe these policy reforms:

Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local communities and for biodiversity conservation (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):

Provide examples of how national REDD Strategies address livelihoods of local communities and biodiversity conservation.

Durante el periodo reportado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuó con el programa Quisqueya Verde, mediante el cual se realizó la plantación de 8,364,475 plántulas de especies endémicas y nativas, en un área de 9 778.85 hectáreas. En esta labor se emplearon 4720 jornaleros, residentes en las comunidades beneficiadas por el programa. Estos comunitarios se organizan en brigadas mixtas de 10 personas, las que en su mayoría son lideradas por mujeres.

Adicionalmente a las ejecutorias del programa Quisqueya Verde, se realizaron otras actividades para la conservación de la biodiversidad, destacándose las ejecutadas en los parques nacionales Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Los Haitises, según detalle a continuación:

Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

En el periodo junio 2016 a Junio 2017, se intervinieron 235 hectáreas en la parte sur del parque, donde se realizó una restauración ecológica a través de la plantación de 184,292 plantas nativas y endémicas. El área restaurada es una zona de ecosistemas críticos para la producción de agua en la subcuenca del río Mulito, afluente del río Pedernales y de importancia estratégica para la Provincia Pedernales. Para esta labor se cuenta con 99 trabajadores de las comunidades locales y un vivero temporal, construido en la finca de Boca de Tanjón, adquirida con fines de protección. Las especies plantadas incluyen la penda, pino criollo, cedro, laurel prieto, cabirma santa, cabirma guinea, caoba y escobón.

Parque Nacional Valle Nuevo.

Se plantaron 23,000 plántulas de *Pinus occidentalis* (Pino Criollo) en 20 hectáreas de terreno en las comunidades de La Siberia y El Castillo, en la cuenca del Río Grande o del Medio.

Parque Nacional de Los Haitises.

Se replantaron más de 8 mil plántulas de mangle rojo con la participación de estudiantes y el grupo ecológico Guardianes Verdes.

3. PROGRESS AT R-PP sub component level

3.1. REDD Readiness Progress

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (*FCPF M&E Framework Indicator 1.A.*): up to 300 words, if applicable.

Progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:

El Readiness Package no ha comenzado su preparación formalmente, debido al bajo nivel de desarrollo en que se encuentra el proceso de preparación del Programa REDD+.

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)

Components	Sub-components	Support from FCPF (Yes/No)
1. Readiness Organization and Consultation	1a. National REDD+ Management Arrangements	Yes
	1b. Consultation, Participation, and Outreach	Yes
	1c. Consultation and Participation Processes	Yes
2. REDD+ Strategy Preparation	2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Yes
	2b. REDD+ Strategy Options	Yes
	2c. Implementation Framework	Yes
	2d. Social and Environmental Impacts	Yes
3. Reference Emissions Level/Reference Levels		Yes
4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards	4a. National Forest Monitoring System	Yes
	4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	Yes

Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):

Planned Milestones:	Level of Achievement ³ :	Tracking ⁴ :															
Subcomponente 1a: Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+.	1a: El proyecto ha creado dos plataformas de participación y consulta: el Comité Técnico Asesor (CTA) y el Comité de Salvaguardas, Plan SESA.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="976 365 1045 428"></td> <td data-bbox="1045 365 1130 428"></td> <td data-bbox="1130 365 1446 428"><i>Significant progress</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 428 1045 491"></td> <td data-bbox="1045 428 1130 491">X</td> <td data-bbox="1130 428 1446 491"><i>Progressing well, further development</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 491 1045 554"></td> <td data-bbox="1045 491 1130 554"></td> <td data-bbox="1130 491 1446 554"><i>Further development required</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 554 1045 617"></td> <td data-bbox="1045 554 1130 617"></td> <td data-bbox="1130 554 1446 617"><i>Not yet demonstrating progress</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 617 1045 680"></td> <td data-bbox="1045 617 1130 680"></td> <td data-bbox="1130 617 1446 680"><i>Non Applicable</i></td> </tr> </table>			<i>Significant progress</i>		X	<i>Progressing well, further development</i>			<i>Further development required</i>			<i>Not yet demonstrating progress</i>			<i>Non Applicable</i>
		<i>Significant progress</i>															
	X	<i>Progressing well, further development</i>															
		<i>Further development required</i>															
		<i>Not yet demonstrating progress</i>															
		<i>Non Applicable</i>															
Subcomponente 1b: Consulta, participación y difusión social.	1b: Está por iniciar los procesos de selección para la contratación de la firma consultora que hará el diseño de la Estrategia de Comunicación.	<p><i>Please explain why:</i></p> <p>El país comenzó la fase preparatoria para REDD+ con un retraso importante, sin embargo estamos avanzando con un buen ritmo, en base a un plan de trabajo bien estructurado y el acompañamiento del Banco Mundial.</p>															
Subcomponente 1.c Procesos de Consulta y Participación	1c: TdRs para la Consultoría que reformulará el diseño del MQRC, en conjunto con el MGAS, SESA y SIS.																
Subcomponente 2a: Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión.	2a: En proceso de selección para la contratación de firma consultora para el estudio sobre las causas de la deforestación y degradación de los bosques.																
Subcomponente 2b: Opciones de Estrategia de REDD+.	2b: Igual que en 2a. Las propuestas de opciones estratégicas para REDD+ se identificarán con la misma consultoría.																

³ Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant of up to \$5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

⁴ The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale "Non Applicable" can be selected.






This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework

<p>Subcomponente 2c: Marco de ejecución.</p>	<p>2c: TdRs elaborados para la contratación de la consultoría “Propiedad del carbono forestal, sistema de registro y transferencia de títulos”.</p>	
<p>Subcomponente 2d: Impactos Sociales y Ambientales.</p>	<p>2d: Están elaborados los TdRs para la consultoría que desarrollará el MGAS, SESA, MQRC y SIS.</p>	
<p>3: Niveles de referencia de las emisiones / niveles de referencia de bosques (REL/FREL).</p>	<p>3: En fase de elaboración de los TdRs para ésta consultoría.</p>	
<p>Subcomponente 4a: Sistema de seguimiento forestal nacional.</p>	<p>4a: En evaluación de propuestas de expresión de interés para esta consultoría.</p>	
<p>Subcomponente 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas.</p>	<p>4b: En fase de elaboración de los TdRs para ésta consultoría</p>	

**Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component (FCPF M&E Framework 1.3.c.).
Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by July 15th each year.**
















	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ <i>(Please select your light rating)</i>
		Planned milestones	Achievements	






⁵ The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.
















	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 1 – Readiness Organization and Consultation and Grievance Redress	<p>Sub-Component 1a – Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+</p> <p><i>Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) Establishing and operationalizing a multi-sector consultative platform on REDD+; (ii) Preparing and implementing the Recipient's (A) communications and information sharing strategy for REDD+; and (B) participation and consultation plan for REDD+.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Act. 1a.1 Reuniones ordinarias del CTA (6/año) • Act. 1a.2 Dos reuniones del CD /año • Act. 1a.3. Reuniones de trabajo extraordinarias de los Comités Especiales (5/año) • Act. 1a.4 Especialista Adquisiciones 	<p>2 de 3 reuniones programadas se realizaron.</p> <p>1 reunión realizada conforme a lo programado.</p> <p>2 reuniones del Salvaguardas realizadas.</p> <p>Especialista en Adquisiciones contratada, con un mes de retraso versus lo planificado. El 14 de junio, la misma presentó su renuncia. Actualmente estamos en el proceso de contratación del Especialista en Adquisiciones</p>			Significant progress
		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en gestión administrativa y financiera de proyectos para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 	<p>Se realizó la capacitación en gestión administrativa y financiera donde participó personal de la UTG.</p>		X	Progressing well, further development
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				<p><i>Please explain why:</i></p> <p>Se han desarrollado la mayoría de actividades planeadas para este sub-componente.</p> <p>Para el mes de agosto se tiene planificada la creación de otros Comités especializados, de las áreas temáticas vinculadas a REDD+.</p>		






Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)															
	Planned milestones	Achievements																
<p>Sub-Component 1b – Consulta, participación y difusión social <i>Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making</i></p> <p><u>Country Self- Assessment Criteria: (b)Development of REDD+ Strategy;</u> <i>(i) Conducting studies and analyses to identify the main direct and indirect drivers of deforestation and forest degradation in the Recipient’s territory.</i> <i>(ii) Identifying strategic policy and programmatic interventions to be mainstreamed framework for REDD+</i> <i>(iv) Carrying out of SESA; (B) preparing an ESMF, including a Process Framework; and (C) preparing a Resettlement Policy Framework.</i></p>	<p>Act. 1b.1. Diseño de una estrategia de comunicación nacional para REDD+, más análisis y propuesta de mejora a plataforma web del proyecto. Act. 1b.2 Implementación de la estrategia de comunicación nacional para REDD+ y mantenimiento de plataforma comunicación basada en la web. Act. 1b.3 Socialización de insumos SESA a los actores involucrados (25 talleres). Act. 1b.4. Especialista en comunicaciones Act. 1b.5 Diseño e implementación de un mecanismo de Quejas, reclamos y resolución de conflictos (GRM) y elaboración de reglamento. Diseño de una estrategia nacional de consulta y participación para REDD+ (SESA). Desarrollo de un MGAS (Environmental and Social Management Framework). Act. 1b.6 Gestionar los arreglos Institucionales y los procesos de SESA y MGAS (30 talleres) Act. 1b.8 Talleres/visitas de campo para la implementación, monitoreo y evaluación de la plataforma de participación y consulta. 30 visitas Act. 1b.11 Especialista Social Act. 1b.12 Adquisición de Software Especializado para i) el Mecanismo de Quejas y Resolución de Conflictos (MQRC), ii) la ONAMET, y iii) la DIARENA.</p>	<p>1b. 1 y 1.b.2. Ya se inició el proceso de licitación para la contratación de la firma consultora que se encargara del Diseño de la Estrategia de Comunicación Nacional.</p> <p>1b. 5 Los TdRs para la contratación de la consultoría que reformulará el MQRC, SESA, MGAS y SIS ya están elaborados.</p> <p>1b. 11 Se contrató el Especialista Social el 31 de mayo del 2017, e inicio sus labores el 1 de junio.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p>Please explain why:</p> <p>Se ha demorado la licitación de la consultoría para el “Diseño de la Estrategia de Comunicación” por insuficiencia de firmas consultoras que calificaran los requisitos de experiencia exigidos en los TdRs.</p> <p>Retraso en la elaboración de TdRs y realización de la consultoría que reformulará el MQRC, MGAS, SESA y SIS, por la tardanza en la contratación del Especialista Social.</p>			Significant progress			Progressing well, further development		X	Further development			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
		Significant progress																
		Progressing well, further development																
	X	Further development																
		Not yet demonstrating progress																
		Non Applicable																
FCPF M&E Framework	24 Feb 2015	16																






	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)															
		Planned milestones	Achievements																
R-PP Component 2 – REDD+ Strategy Preparation	<p>Subcomponent 2a: Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión.</p> <p><i>Purpose: identification of key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource right, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy</i></p>	<p>Act. 2a.2 Análisis de causas directas e indirectas (drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) en República Dominicana, y propuestas de alternativas de uso sostenible del suelo que disminuyen la DD y aumentan los reservorios de carbono.</p>	<p>2a. 2 Se elaboraron los TdR. Estamos en proceso de licitación de esta consultoría.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p>Please explain why:</p> <p>Retraso registrado en la ejecución de la consultoría para el estudio de: Causas Directas e Indirectas de la Deforestación, la cual proveerá las opciones estrategias a analizar mediante los talleres SESA; debido a insuficiencia de proveedores que expresaran interés en la consultoría. Se dará una prórroga de 14 días para el envío de nuevas expresiones de interés y se invitará a empresas extranjeras con experiencias de trabajo en R. D.</p> <p>Se inició el proceso de licitación para estos estudios, los cuales deberán estar finalizados para diciembre 2017.</p>			Significant progress			Progressing well, further development		X	Further development			Not yet demonstrating progress			Non Applicable
					Significant progress														
		Progressing well, further development																	
	X	Further development																	
		Not yet demonstrating progress																	
		Non Applicable																	
	<p>Act. 2a.4 “Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para el Programa de Reducción de Emisiones en República Dominicana”.</p> <p>Act.2a.5 Análisis de las influencias de los sectores productivos sobre REDD+.</p> <p>Act. 2a.6 Especialista en Suelos, Agricultura y Bosques.</p>	<p>2a. 4 y 2a. 5 Se elaboraron los TdR. Estamos en proceso de licitación de esta consultoría.</p> <p>2a. 6 Se contrató al Especialista en Suelos, Agricultura y Bosques en abril 2017.</p> <p>* Se identificó la necesidad de elaborar los mapas de uso y cobertura del suelo 2015 (actualización 2010-2005) y deforestación en la República Dominicana.</p>																	
















Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)																	
	Planned milestones	Achievements																		
<p>Subcomponent 2b: Opciones de Estrategia de REDD+</p> <p><i>Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; Identifying strategic policy and programmatic interventions to be mainstreamed into the Recipient's national development strategy.</i></p>	<p>Act. 2b.1 Propuesta de alternativas de usos sostenibles del suelo que disminuyen la DD y aumentan los reservorios de carbono.</p>	<p>2b. 1 Los Términos de Referencia están elaborados. Esta actividad está en proceso de licitación.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p><i>Please explain why:</i></p> <p>Igual situación de retraso que presenta la consultoría "Análisis de causas directas e indirectas (drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) en República Dominicana.</p>			Significant progress			Progressing well, further development		X	Further development			Not yet demonstrating progress			Non Applicable		
		Significant progress																		
		Progressing well, further development																		
	X	Further development																		
		Not yet demonstrating progress																		
		Non Applicable																		

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)		
	Planned milestones	Achievements			
<p>Subcomponent 2c: Marco de ejecución (framework)</p> <p><i>Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options</i></p> <p><i>Country Self-Assessment</i></p> <p><i>Criteria: 2.01, b, (iii) Designing an implementation framework for REDD+;</i></p>	<p>Act. 2c.1 Especialista legal</p> <p>Act. 2c.2 Análisis marco legal, institucional y de cumplimiento para las salvaguardas de REDD+</p> <p>Act. 2c.3 Propiedad del carbono forestal, sistema de registro y transferencia de títulos de reducción de emisiones en la República Dominicana.</p>	<p>2c.1 Se realizó el llamado a la presentación de postulaciones y está en proceso de selección.</p> <p>2c.2 TdRs elaborados.</p> <p>2c.3 TdRs elaborados.</p>			Significant progress
					Progressing well, further development
				X	Further development
					Not yet demonstrating progress
					Non Applicable
			<p><i>Please explain why:</i></p> <p>Retraso en la contratación del especialista legal, debido a que las competencias de los postulantes han estado por debajo de los requerimientos.</p>		

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)																	
	Planned milestones	Achievements																		
<p>Subcomponent 2d: Impactos sociales y ambientales</p> <p><i>Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework</i></p>	2d.2 Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)	2d.2 TdRs elaborados para ésta consultoría.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Significant progress			Progressing well, further development required		X	Further development			Not yet demonstrating progress			Non Applicable		<p><i>Please explain why:</i></p> <p>Está por iniciar el proceso de selección para la contratación de la firma consultora que realizará el MGAS, el MQRC y los talleres de Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA).</p>
		Significant progress																		
		Progressing well, further development required																		
	X	Further development																		
		Not yet demonstrating progress																		
		Non Applicable																		

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 3 – Reference Emissions Level/Reference Levels	<p>R-PP Component 3 - Niveles de referencia de las emisiones / niveles de referencia</p> <p><i>Purpose: Establishing a Reference emissions level and forest reference level in the Recipient's territory.</i></p> <p><u>Country Self- Assessment Criteria:</u></p> <p><i>(c)Development of a Forest Reference Emission Level and Forest Reference Level.</i></p>	<p>Act. 3.1 Soporte técnico para el desarrollo y envío del nivel de referencia (REL/FREL) a la UNFCCC. Generar factores de expansión y/o ecuaciones alométricas por tipo de bosque.</p>	<p>La República Dominicana cuenta con una primera versión de niveles de referencia.</p> <p>Se cuenta con datos del pre-muestreo del Inventario Nacional Forestal (INF) y se están formulando los TdRs para la evaluación de No Bosque. También se está en proceso de contratación de la consultoría para la determinación de la serie histórica de uso y cambio de uso de suelo 2005-2010-2015.</p>			Significant progress
					X	Progressing well, further development required
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				<p>And explain why: Con los datos de la actividad 3.1 se elaborará los Niveles de Referencia para el Programa de Reducción de Emisiones.</p>		

	Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ (Please select your light rating)		
		Planned milestones	Achievements			
R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards	<p>Sub-component 4a: Sistema de seguimiento forestal nacional <i>Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time.</i> <i>Country Self-Assessment</i> <i>Criteria:</i> <i>(e) Monitoring and Evaluation Framework.</i></p> <p>Designing and implementing: (i) a national forest monitoring system; and (ii) a national information system for (A) multiple benefits documentation of other impacts that may be emanating from future REDD+ activities; and safeguards.</p>	<p>Act. 4a.1 Establecer el marco lógico y los arreglos institucionales necesarios para MRV.</p> <p>Act. 4a.2 Desarrollo de un prototipo de plataforma de información para monitorear las actividades forestales y de LULUCF</p> <p>Act. 4a.3 Inventario Nacional Forestal (Trabajo de campo)</p>	<p>4a.1 y 4a.2 Estamos en consultas con expertos de instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de obtener información básica necesaria para la formulación de los TdRs correspondientes.</p> <p>4a.3 Se está licitando el Inventario Nacional Forestal (INF). Actualmente estamos en la fase de selección de la empresa consultora para la ejecución del Inventario Nacional Forestal.</p>			Significant progress
					X	Progressing well, further development
						Further development
						Not yet demonstrating progress
						Non Applicable
				<p>And explain why:</p> <p>Actualmente estamos en el proceso de selección de la firma consultora que estará realizando la segunda fase del Inventario Nacional Forestal. Se está elaborando los TdR de los acápites 4a. 1 y 4a. 2</p>		

Sub-component	Progress against annual targets		Tracking ⁵ <i>(Please select your light rating)</i>																
	Planned milestones	Achievements																	
<p>Subcomponent 4b: Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas.</p> <p><i>Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards</i></p>	4b.1 Desarrollo de un Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas.	En proceso de consulta con especialistas para la obtención de información básica necesaria para la formulación de los TdRs correspondientes	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p>And explain why:</p>			Significant progress			Progressing well, further development		X	Further development			Not yet demonstrating progress			Non Applicable	
		Significant progress																	
		Progressing well, further development																	
	X	Further development																	
		Not yet demonstrating progress																	
		Non Applicable																	

Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):																	
	Rate	Tracking															
RF Grant - disbursement rate vs. planned disbursements El porciento desembolsado de la donación (USD\$3,8 millones) es de un 14.06% hasta la fecha.	14.06	<p>Please select your rating:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Between 10-25% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 25-40% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Up to 10% variance with plans		X	Between 10-25% variance with plans			Between 25-40% variance with plans			More than 40% variance			Non Applicable
		Up to 10% variance with plans															
	X	Between 10-25% variance with plans															
		Between 25-40% variance with plans															
		More than 40% variance															
		Non Applicable															





Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):																	
	Rate	Tracking															
Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. planned disbursements (including other funding sources and FCPF Readiness Grant) A la fecha se ha desembolsado USD\$1,944,432.91 del total presupuestado.	38.30%	<p>Please select your rating:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 10-25% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Between 25-40% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table>			Up to 10% variance with plans			Between 10-25% variance with plans		X	Between 25-40% variance with plans			More than 40% variance			Non Applicable
		Up to 10% variance with plans															
		Between 10-25% variance with plans															
	X	Between 25-40% variance with plans															
		More than 40% variance															
		Non Applicable															

3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD +

Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.1.a.):	
Action/activity:	Describe IP, CSO, and local community participation:
1. Reunión del Comité Técnico Asesor.	Los miembros del CTA participaron en la socialización del Plan de Trabajo del Proyecto para Preparación de REDD+. Además se reunieron para conformar el Comité de Salvaguardas.

2.	1er. Taller de capacitación Comité Técnico Asesor de REDD+ RD - Grupo Facilitador de Salvaguardas.	Se comprometieron a confirmar la participación de manera formal y la designación de un representante permanente y un suplente frente a dicho comité. Poner en que consistió la capacitación y quien la impartió.
3.	1er. y 2do. Taller de expertos para "Definición de Bosque y Degradación en el contexto REDD+".	Las organizaciones se integraron a la discusión del tema haciendo sus aportes técnicos, conforme a sus roles institucionales y enfoque de su área de actividad. Estuvieron presentes Abner Jiménez, Especialista del Programa REDD+/CCAD/ GIZ, Ben de Jong, líder internacional para la preparación del ERPD, y expertos nacionales.
4.	2do. Taller de capacitación Comité Técnico Asesor de REDD+ - Grupo Facilitador de Salvaguardas.	Los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs) plantearon sus expectativas e inquietudes en las discusiones sobre las salvaguardas, y su rol en el proceso de construcción de la Estrategia REDD, y particularmente en el Enfoque Nacional de Salvaguardas.

Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):

<u>Please list the training conducted:</u>	<u>Duration (# of days)</u>	<u># of participants # of men / # of women</u>			<i>Targets in terms of number of men and women to be trained by country to be</i>
1. 1er. Taller de capacitación Comité Técnico Asesor de REDD+ RD - Grupo Facilitador de Salvaguardas.	<u>2</u>	24/23		X	
					
					
					<i>Non Applicable</i>
2. Taller "Definición de Bosques y Degradación en contexto REDD+".	<u>1</u>	10/7			
3. 2do. Taller de capacitación Comité Técnico Asesor de REDD+ - Grupo Facilitador de Salvaguardas.	<u>2</u>	15/11			

4. Segundo Taller "Definición de Bosques y Degradación en contexto REDD	<u>1</u>	10/3	
---	----------	------	--

3.3. Knowledge sharing

El intercambio de conocimientos

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support:	
Yes/No: No	<u>Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during reporting period :</u>

How many people have been reached by these knowledge products, if any:	
Overall number by product: N/A <u># of Men:</u> <u># of Women:</u>	

Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how many (men and women)?		
Yes/No: No	<u>List the South-South learning activities:</u>	<u># of men:</u> (IP/CSO representatives, private sector representatives) <u># of women:</u> (IP/CSO representatives, private sector representatives)

4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required to address this change.

Las principales dificultades, obstáculos o limitaciones que se han presentado en el proceso de la Estrategia Nacional REDD+ en República Dominicana, tienen que ver con lo siguiente:

- a) **Conformación UTG-disponibilidad personal profesional:** Escasa disponibilidad de personal profesional con el perfil requerido para los distintos puestos de la UTG. Los términos de referencia en casos específicos fueron modificados para ajustarnos a la oferta del mercado profesional. Se mantuvieron los requerimientos mínimos que garanticen el buen desempeño de la UTG.
- b) **Desconocimiento de informaciones sobre el mercado y algunos aspectos técnicos de los bienes y servicios adquiridos.**
En las primeras adquisiciones de bienes y servicios hubo que declarar desierto cuatro procesos (3 de bienes y 1 servicio de consultoría), debido a que las especificaciones requeridas en los TdRs no coincidían con la capacidad de la oferta del mercado de la República Dominicana.
- c) **Escasa oferta nacional para los estudios básicos del proyecto.** La poca oferta por parte de las empresas consultoras locales, en torno al llamado de expresión de interés para las primeras consultorías del proyecto, está reflejando cierto retraso en las mismas. Abrir el proceso con invitaciones a empresas internacionales para algunos casos, podría agilizar el proceso para algunas consultorías faltantes. Se adoptó el método de selección basada en calificación de los consultores en lugar de selección basada en calidad (SBC) para algunos casos, con la finalidad de agilizar el proceso de adquisiciones.
En estrecha colaboración con personal clave del Banco se ha puesto atención especial para que los estudios previstos aborden de manera adecuada estos temas relevantes.
- d) **Coordinación interinstitucional**

Se continúa haciendo esfuerzos para mejorar la colaboración interinstitucional entre los actores públicos y privados vinculados a REDD+. El programa ha contribuido a estrechar las relaciones y desarrollar

5. MAIN LESSONS LEARNED

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of the readiness process. It is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with issues of particular interest to REDD+.

1. Convocatorias para la presentación de expresiones de interés.

Diversificar las fuentes de difusión de información (página WEB, Prensa escrita de circulación Nacional, redes profesionales del área ambiental y contacto directo), rinde mejores resultados. La publicación por el periódico de circulación nacional y la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no fueron suficiente para generar la cantidad y calidad de ofertas requeridas.

2. Abordaje de las salvaguardas sociales y ambientales.

Es posible establecer sinergias con otras iniciativas tanto nacionales como internacionales, para desarrollar las bases del Sistema Nacional de Salvaguardas. Tal es el caso del apoyo recibido de CARE-PRCC para desarrollar el enfoque nacional de salvaguardas.

3. Talleres de definición de bosque y no bosque.

La necesidad de la definición de bosque y no bosque en contexto REDD+ permitió identificar vacíos en el marco jurídico de la República Dominicana. Además, en el proceso de definición de bosques, surgió la necesidad de definir "No Bosque" y "degradación", a fin de evitar ambigüedades y conflictos en casos de manejo agropecuario y forestal, así como otros usos de la Tierra.
